

哈尔滨商业大学后勤整改项目周报

一、学生宿舍维修改造工程

(一)粉刷工程

A 区 13#—17#楼粉刷已全部完工。

B 区 1#、2#楼粉刷已全部完工。

C 区 3#、4#楼粉刷已全部完工。

按合同工期要求，粉刷工程已全部按时完成。

(二)其他维修工程

C10#楼拆除工程已完成，塑钢窗已安装完毕，正抹窗口。卫生间及寝室瓷砖已进场。寝室门已进场，准备安装。卫生间给排水布管线，各寝室电工布线。

南 5#楼待内部腾空，预计两三日内进场施工。

宿舍粉刷工程

A17




A16



A15




A14

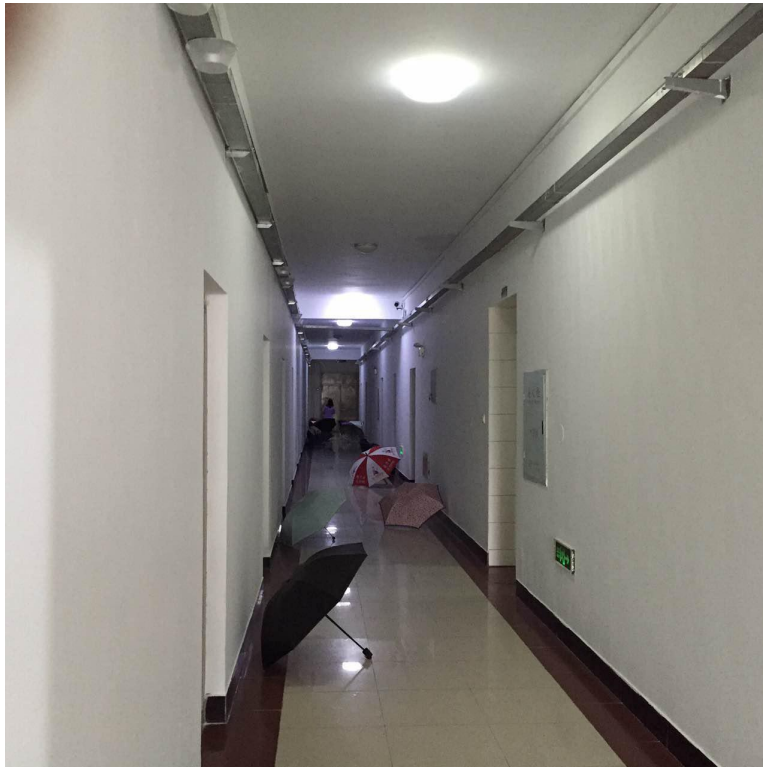

A13



B1

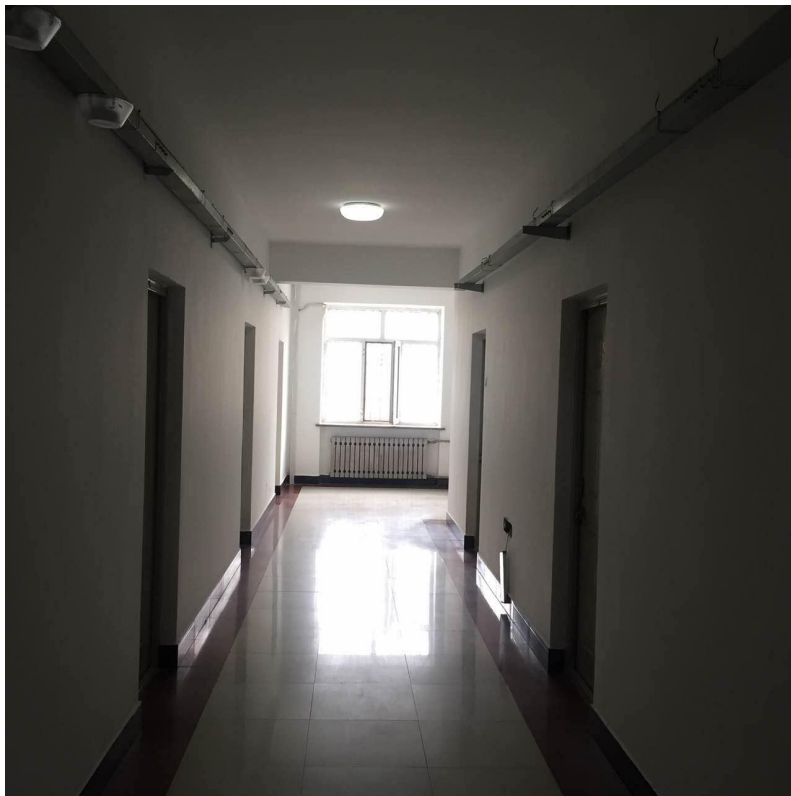

B2



C3



C4



宿舍维修工程


C10#楼拆除已完




C10#楼水电布线中





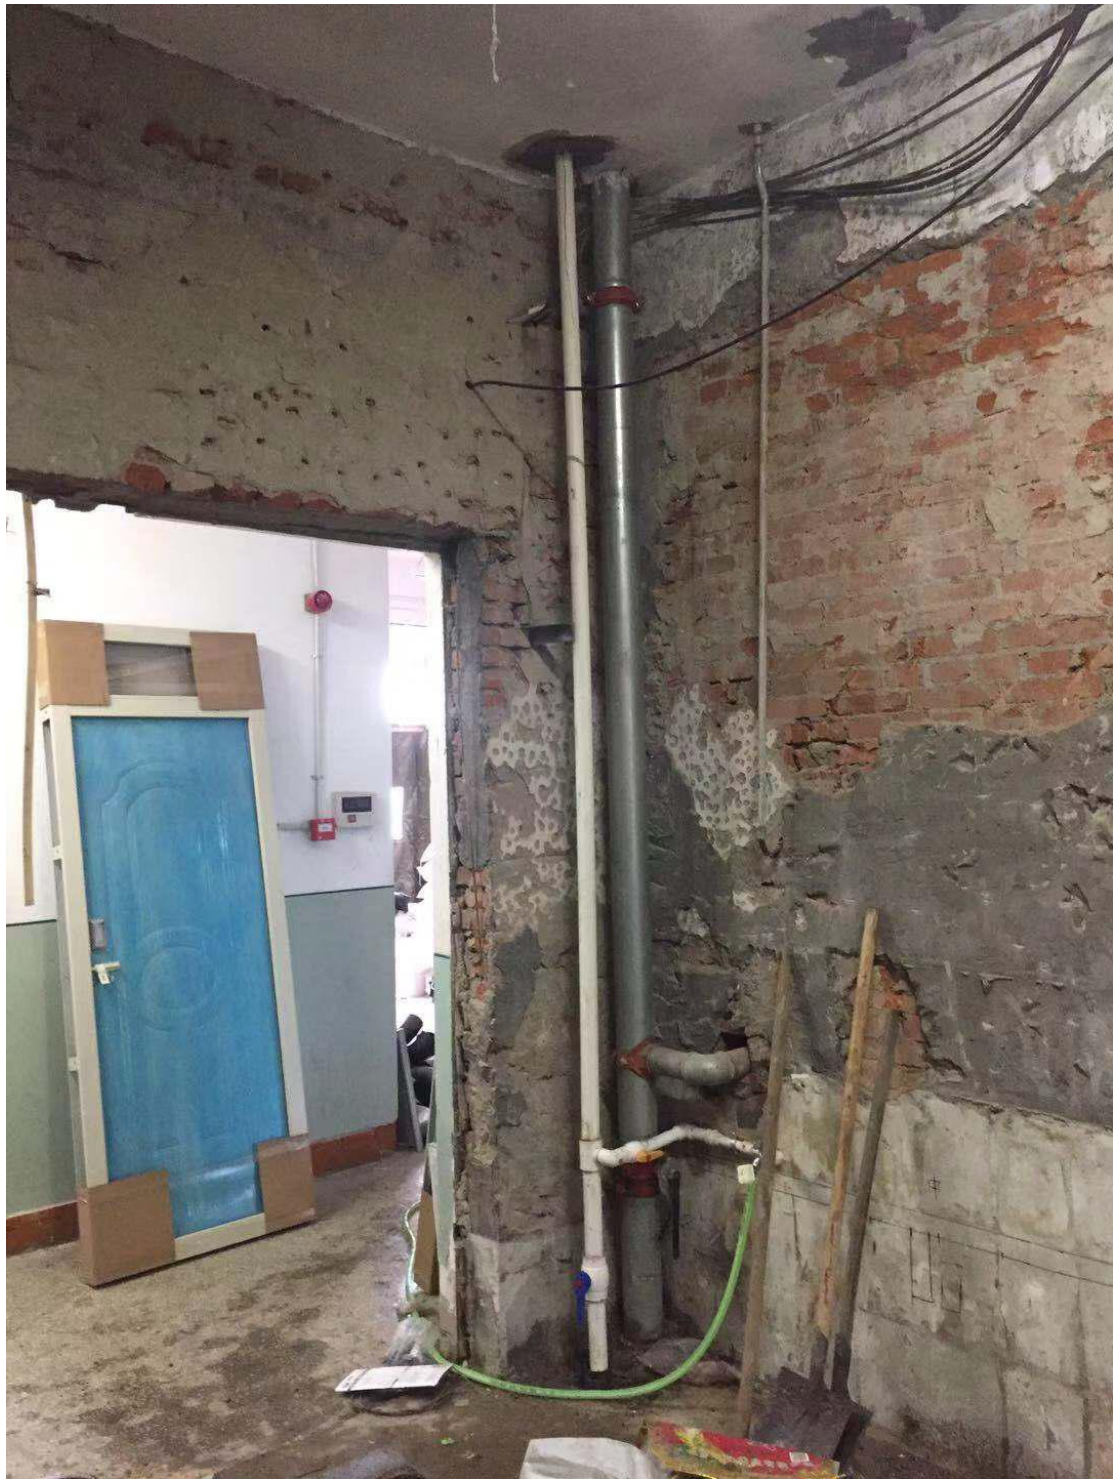


C10#楼门已到货，准备安装

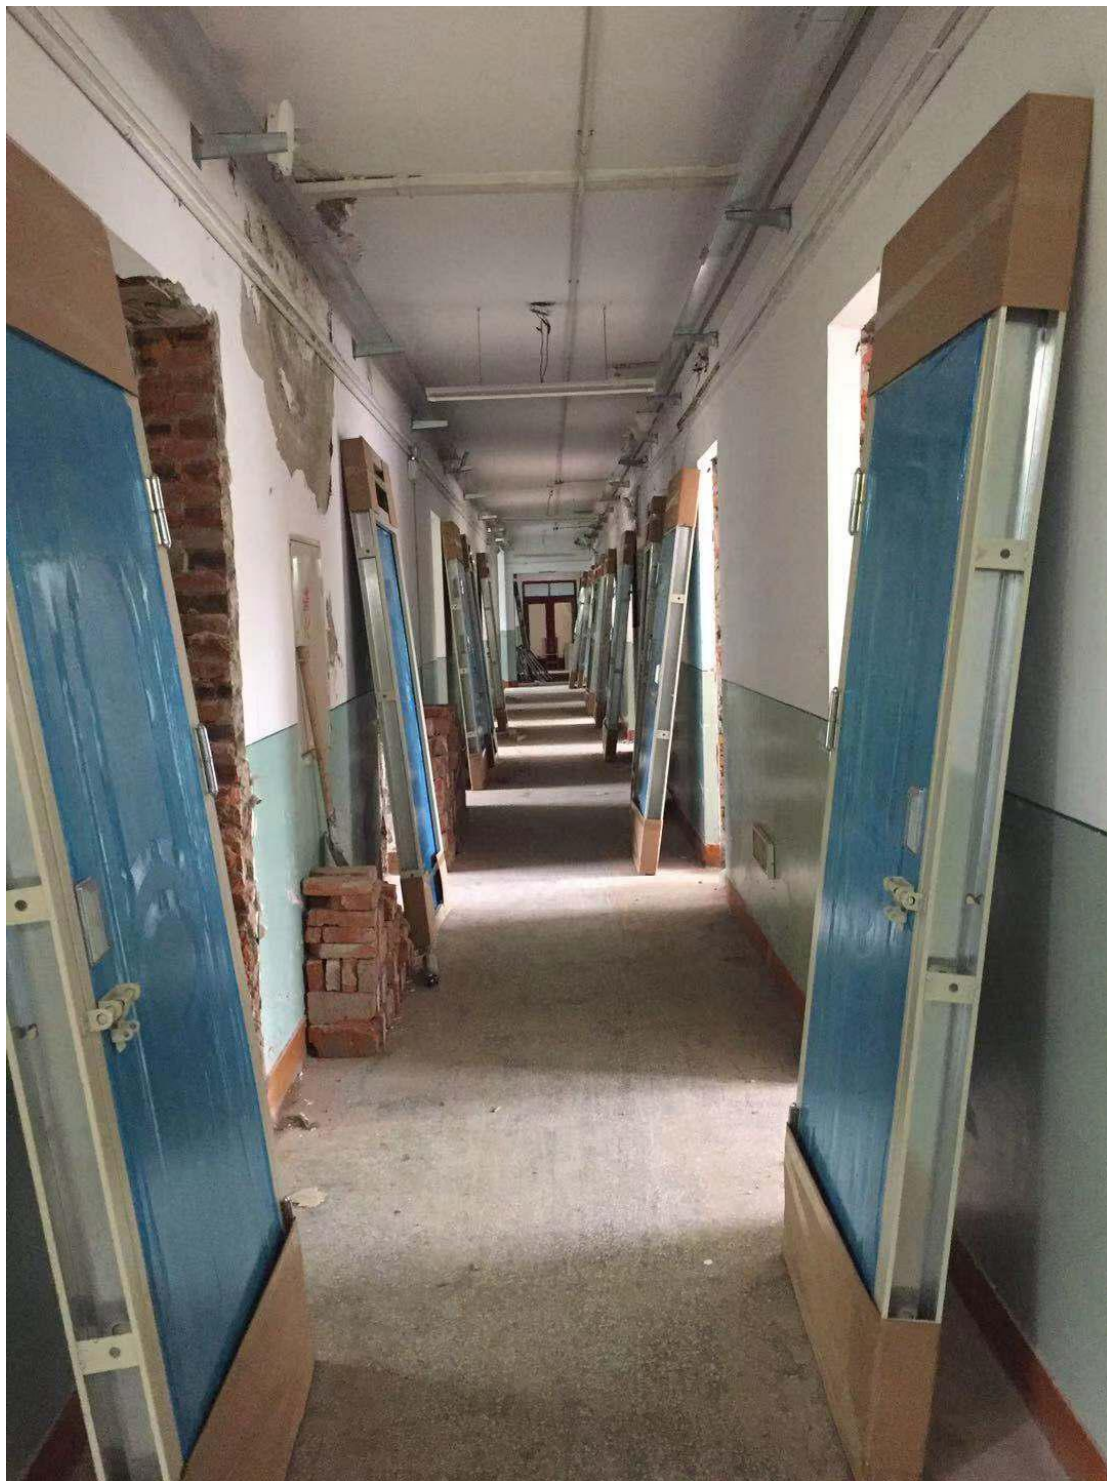

二、B、C 区供水维修改造工程


本周施工进度：J5-J4 节点段施工 De250——59m，J5 节点阀门井的砌筑 J5-J4 节点沟槽；C 区通往第五公寓地沟口处开完及降水、支护；C 区 10 节点处开完及降水、支护；C 区 J7 节点处开完及降水、支护；B 区 J12、J13 节点的井室开挖、B 区 J12、J13 节点的井室垫层；B 区 J4、J2 节点的井室开挖、管段施工 De315——30 米；B 区 J14、J15、J16 井室底开挖及垫层；B 区 J12、J13 管段的施工 De125-57 米；B 区 J14、J15、J16 管道的施工 De125-70m；B 区第二公寓及第一公寓前管道施工 J16、J17 井室的开挖；B 区 J14、J15、J16 井室底垫层；B 区第二公寓及第一公寓前管道施工 e125-75m
B 区第二公寓及第一公寓前管道施工 J16、J17 井室底垫层；B 区 J14、J15、J16 管道的施工 De125-70m；C 区 J7、J10 、通往第五公寓地沟口处围挡；B 区第二公寓及第一公寓前管道施工 De125-75m。

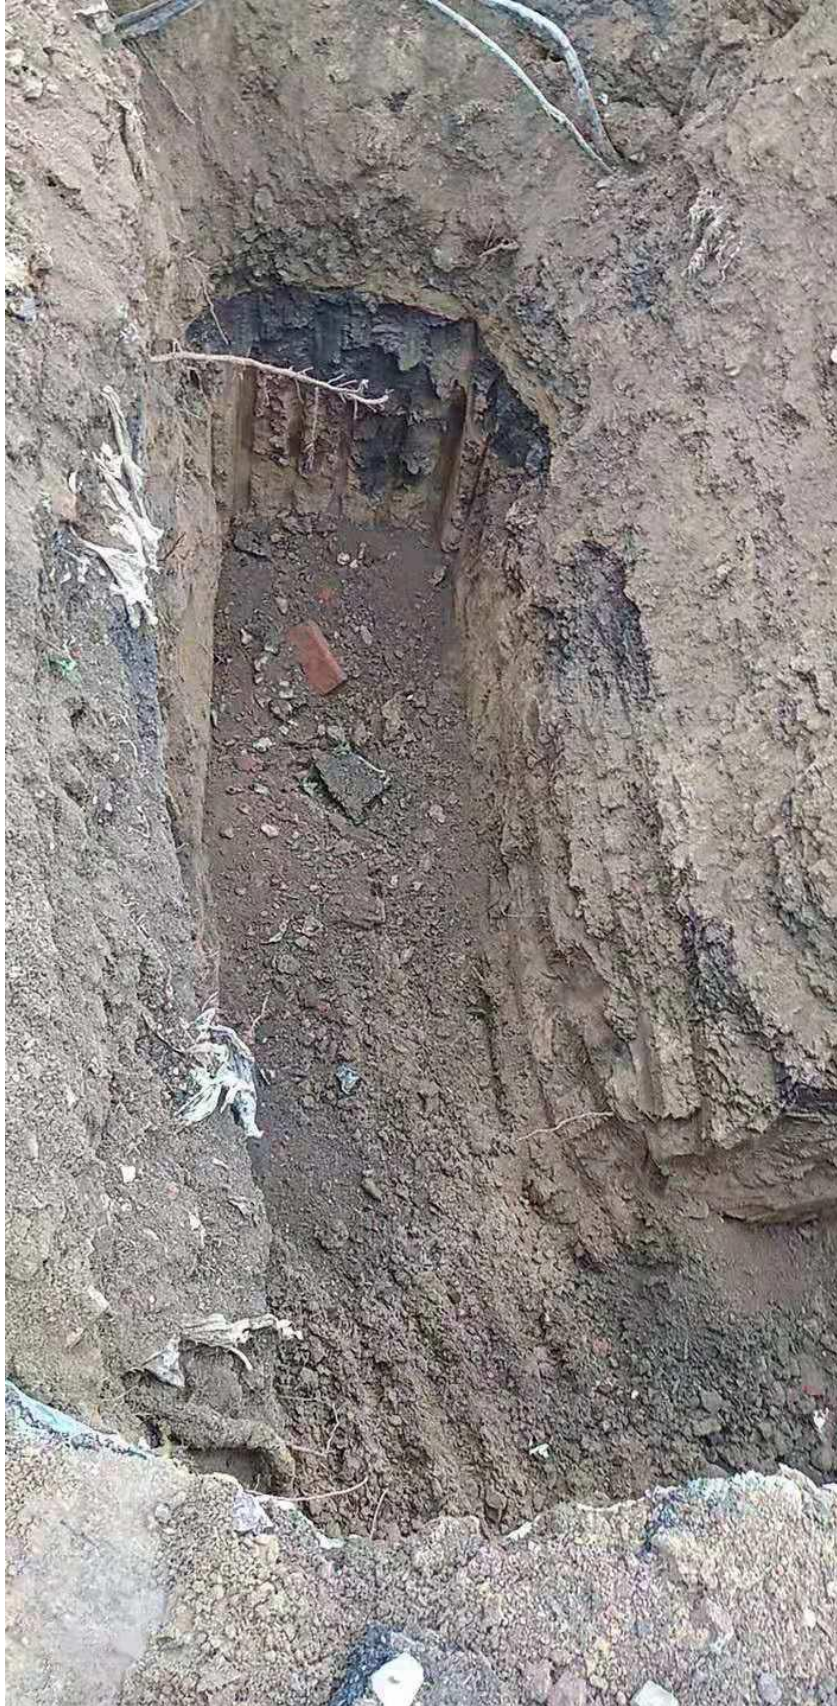







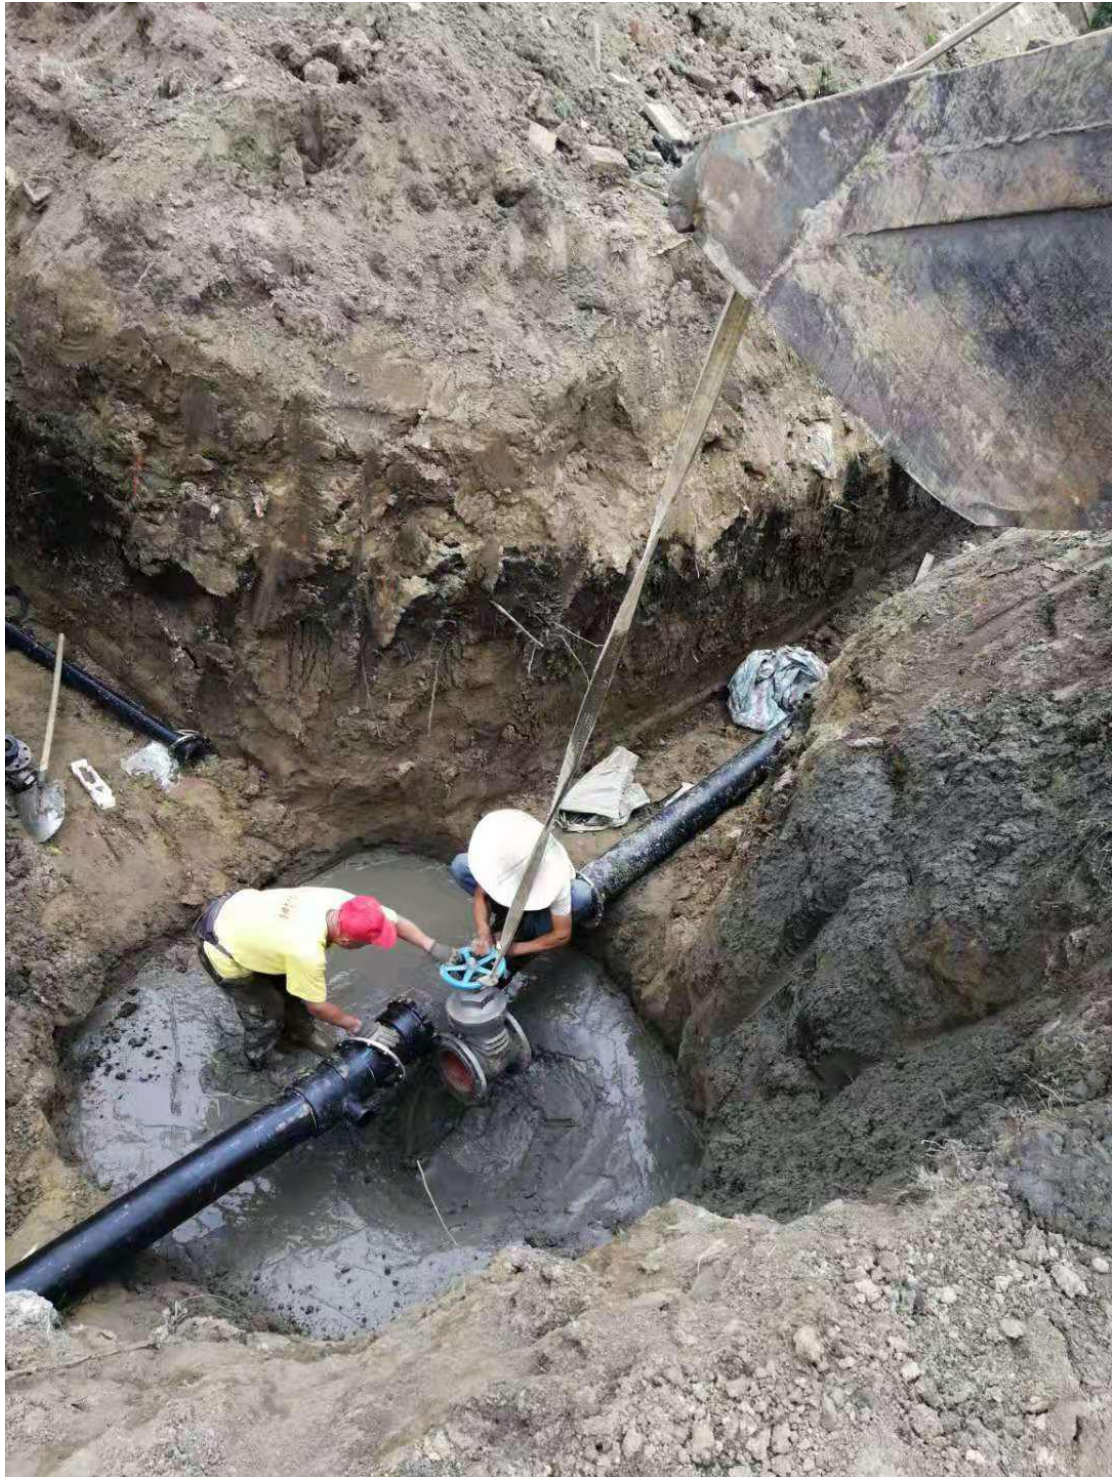

三、校园基础设施维修改造工程

中心广场火烧板改造工作基本结束；各部位需要扶正的边石前期挪移工作已经结束；图书馆后体育馆西边石已经扶正，步道板已经铺设完毕；食堂前步道板已更换百分之八十，剩余百分之二十因雨暂停；体育馆后侧步道板铺设工作基本完成；地下通道边石扶正，步道板更换工作因雨暂停。







四、学生宿舍外墙保温及粉刷工程
8月22日招标。

五、技防升级改造工程
已确定中标单位，拟签订合同。

二〇一九年八月十七日
